




Espaces publics de La Paillette

Phase chantier

3 septembre 2019





Plan général et limites du chantier

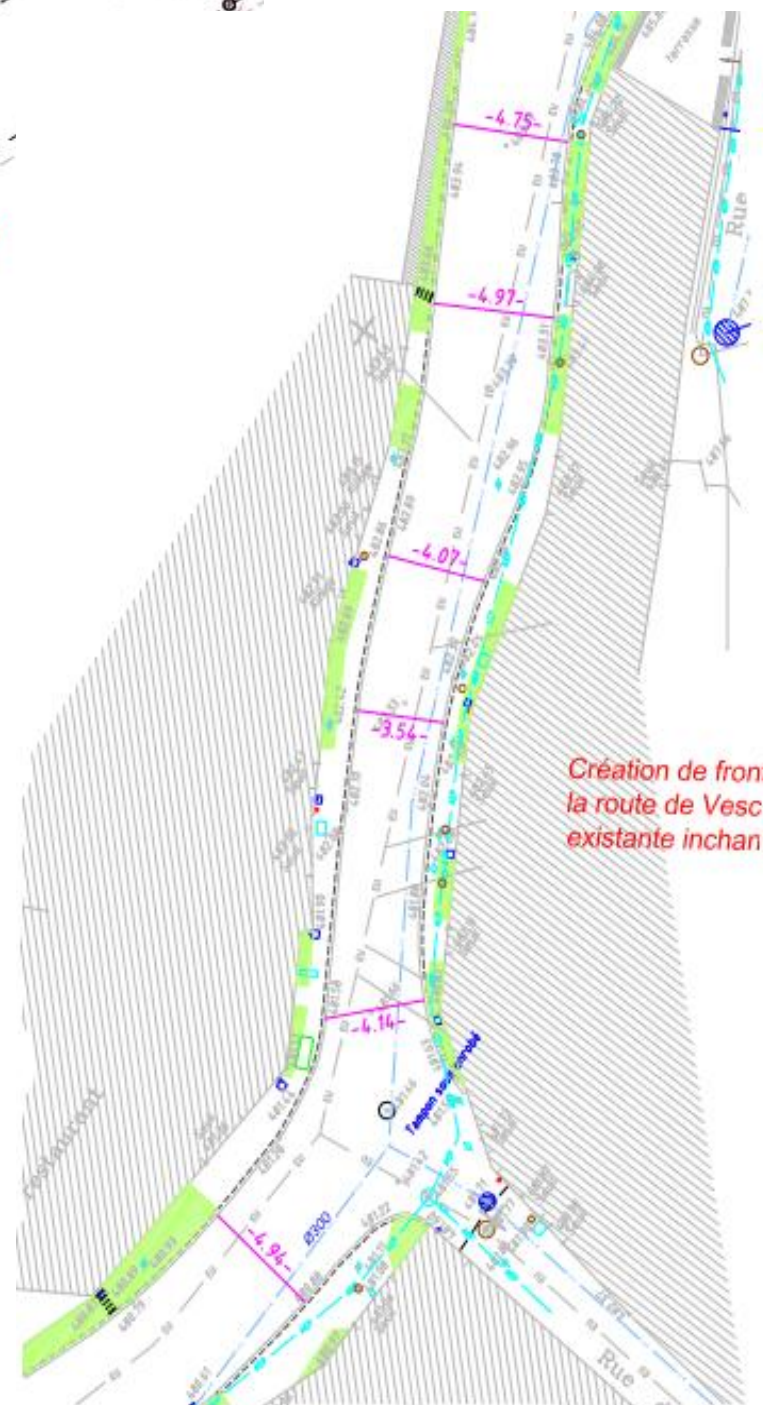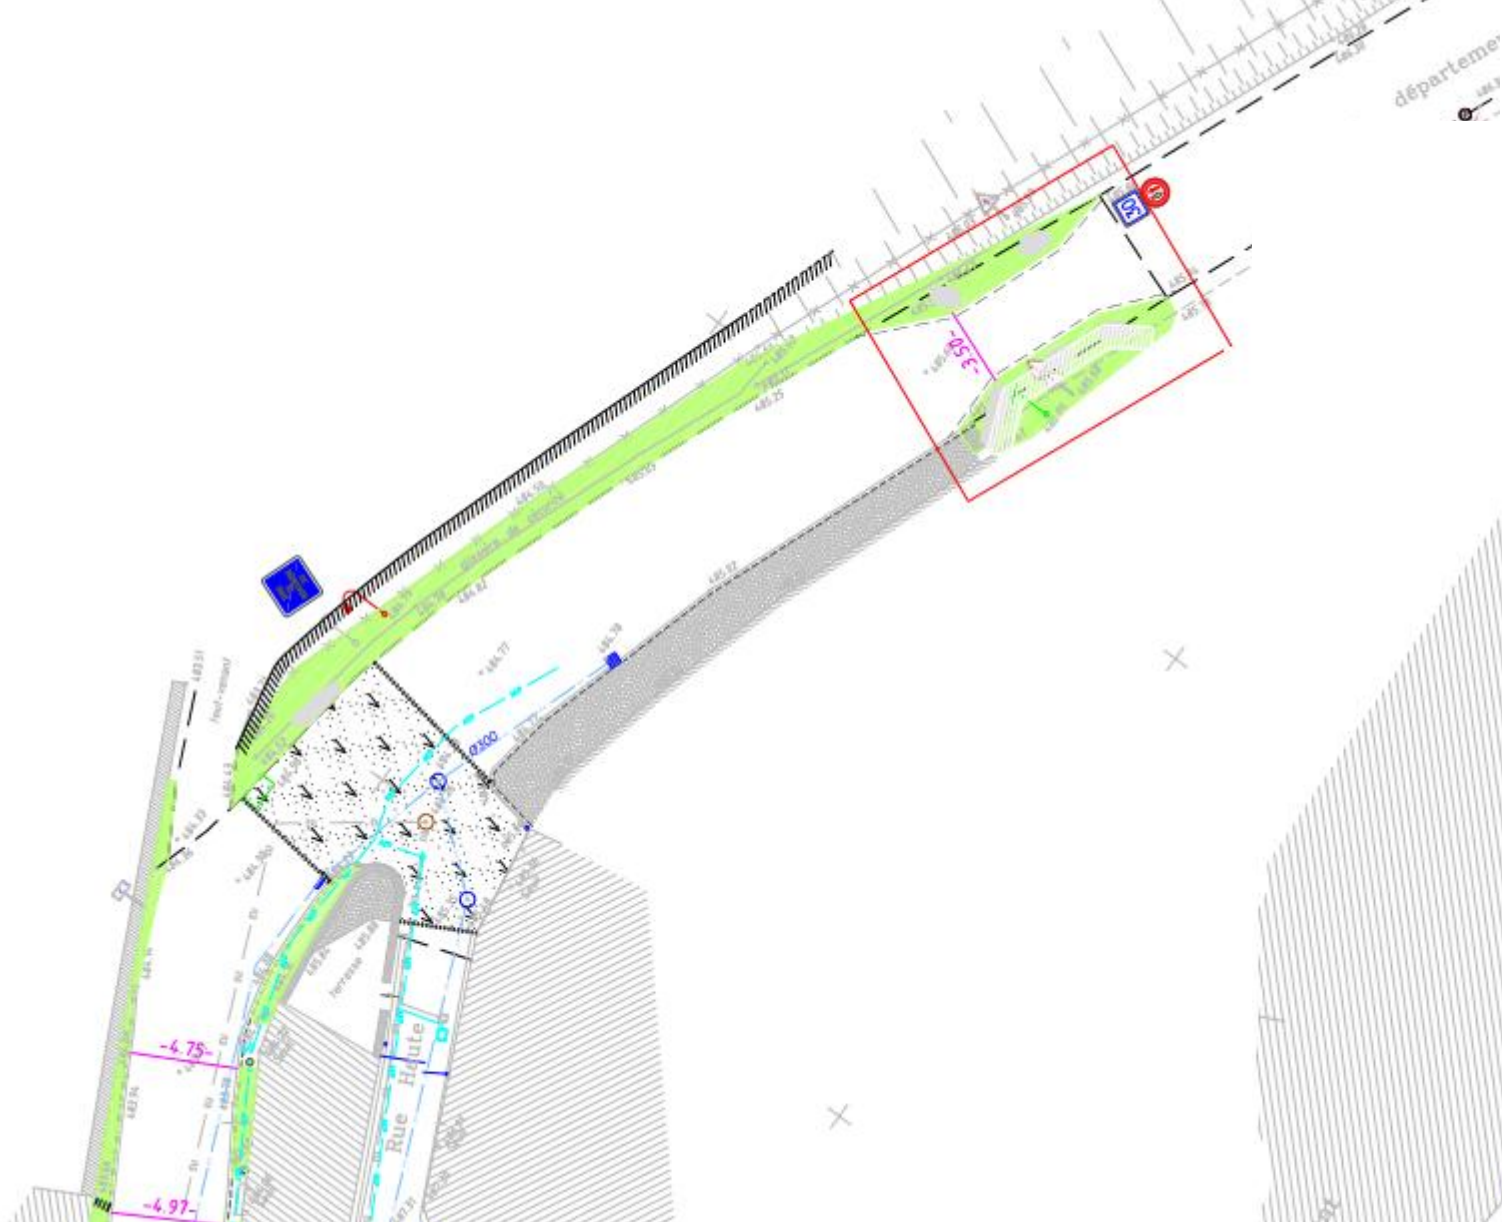

Route de Vesc

Route de Teyssières

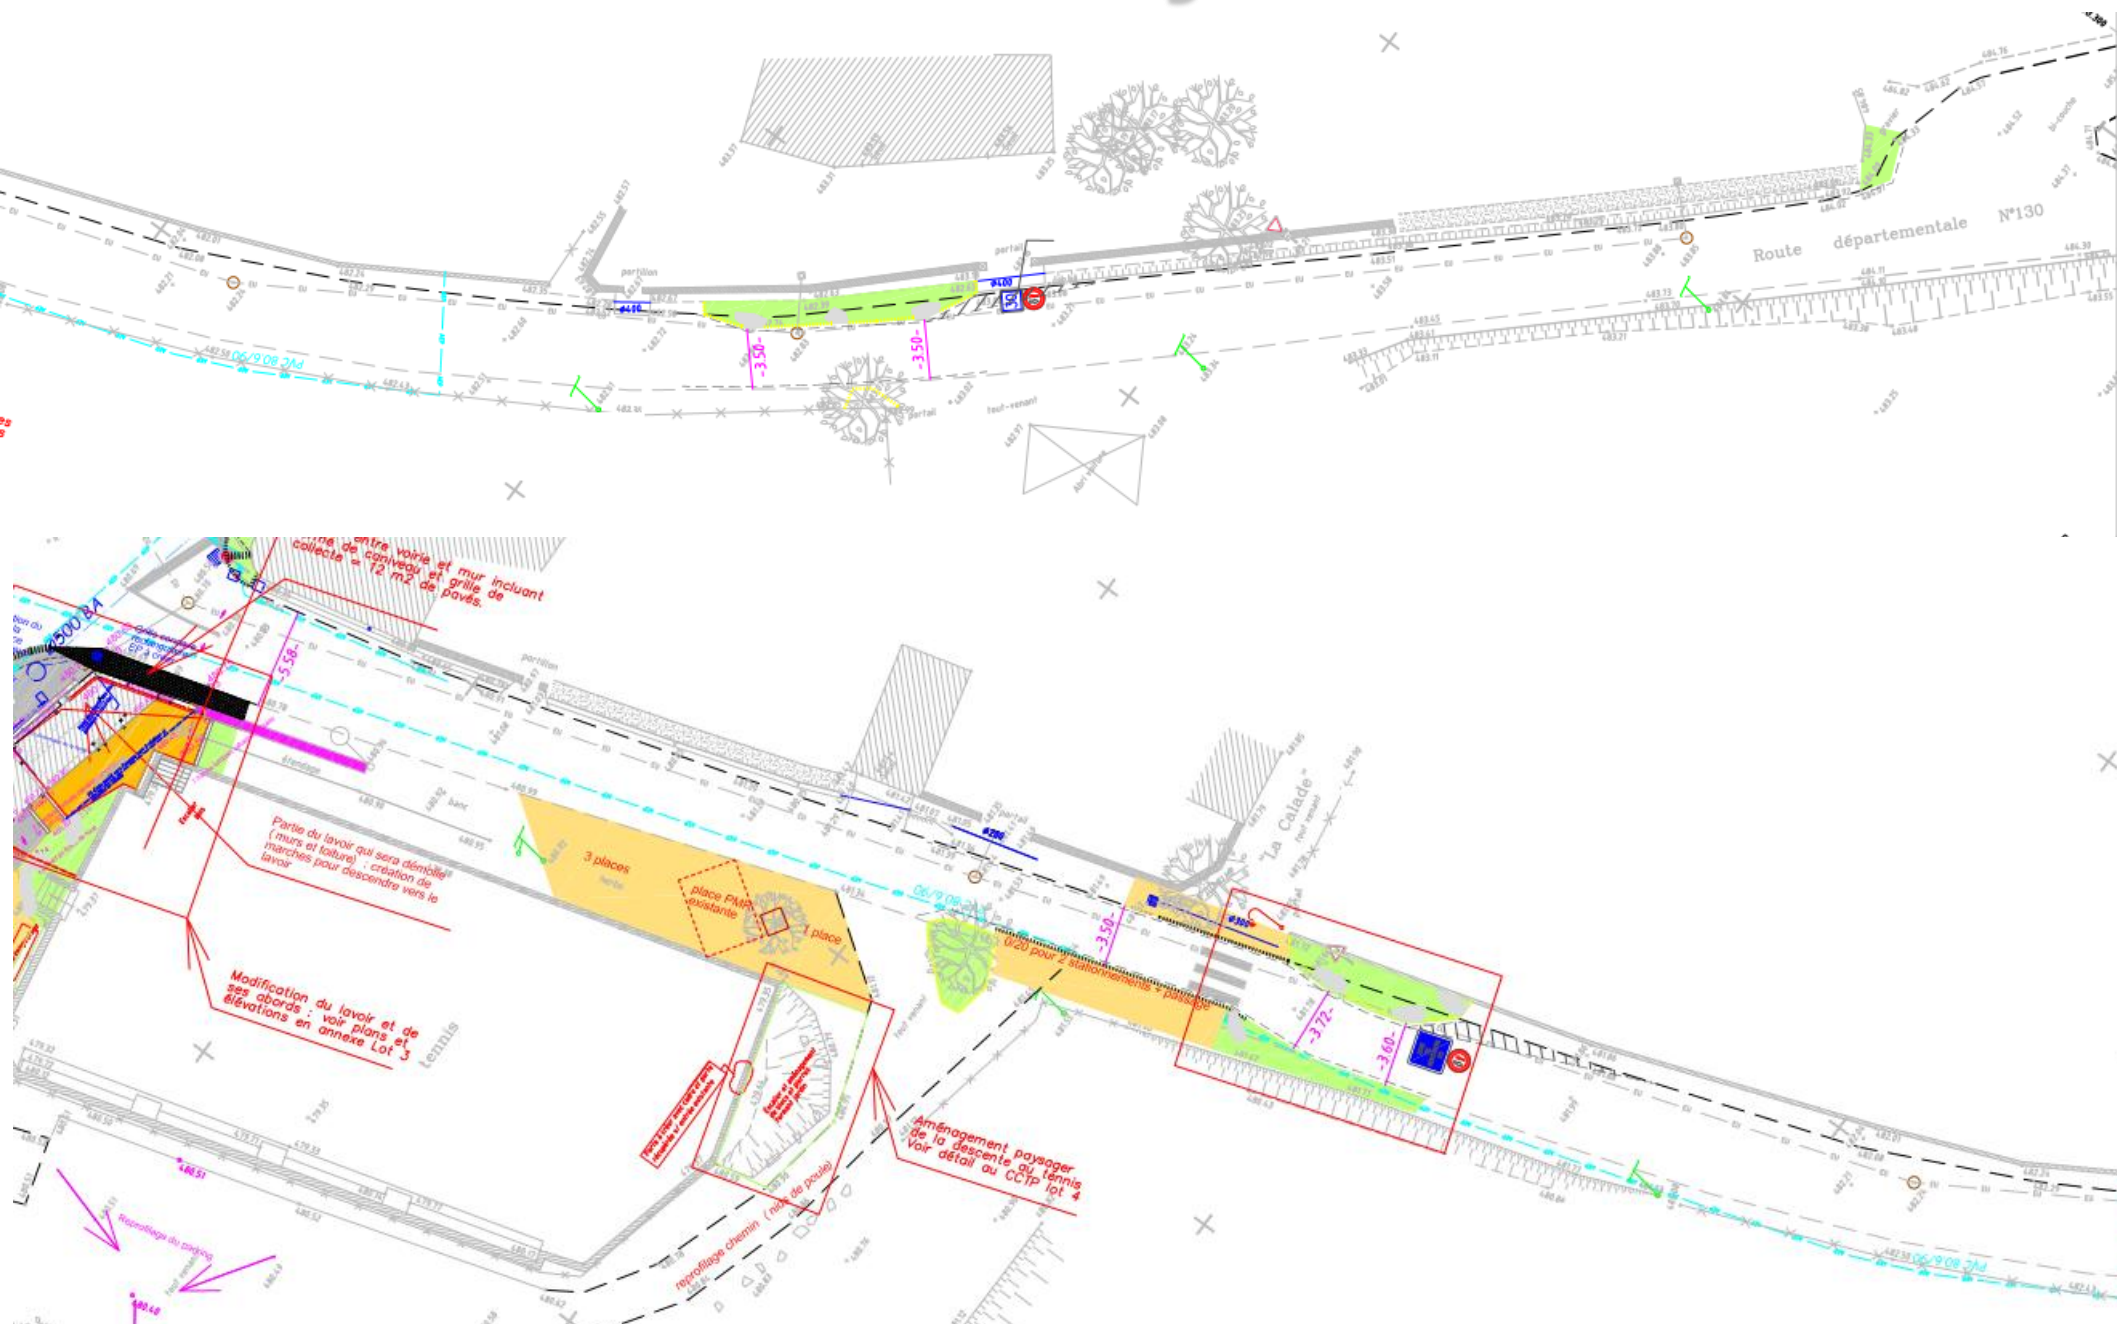

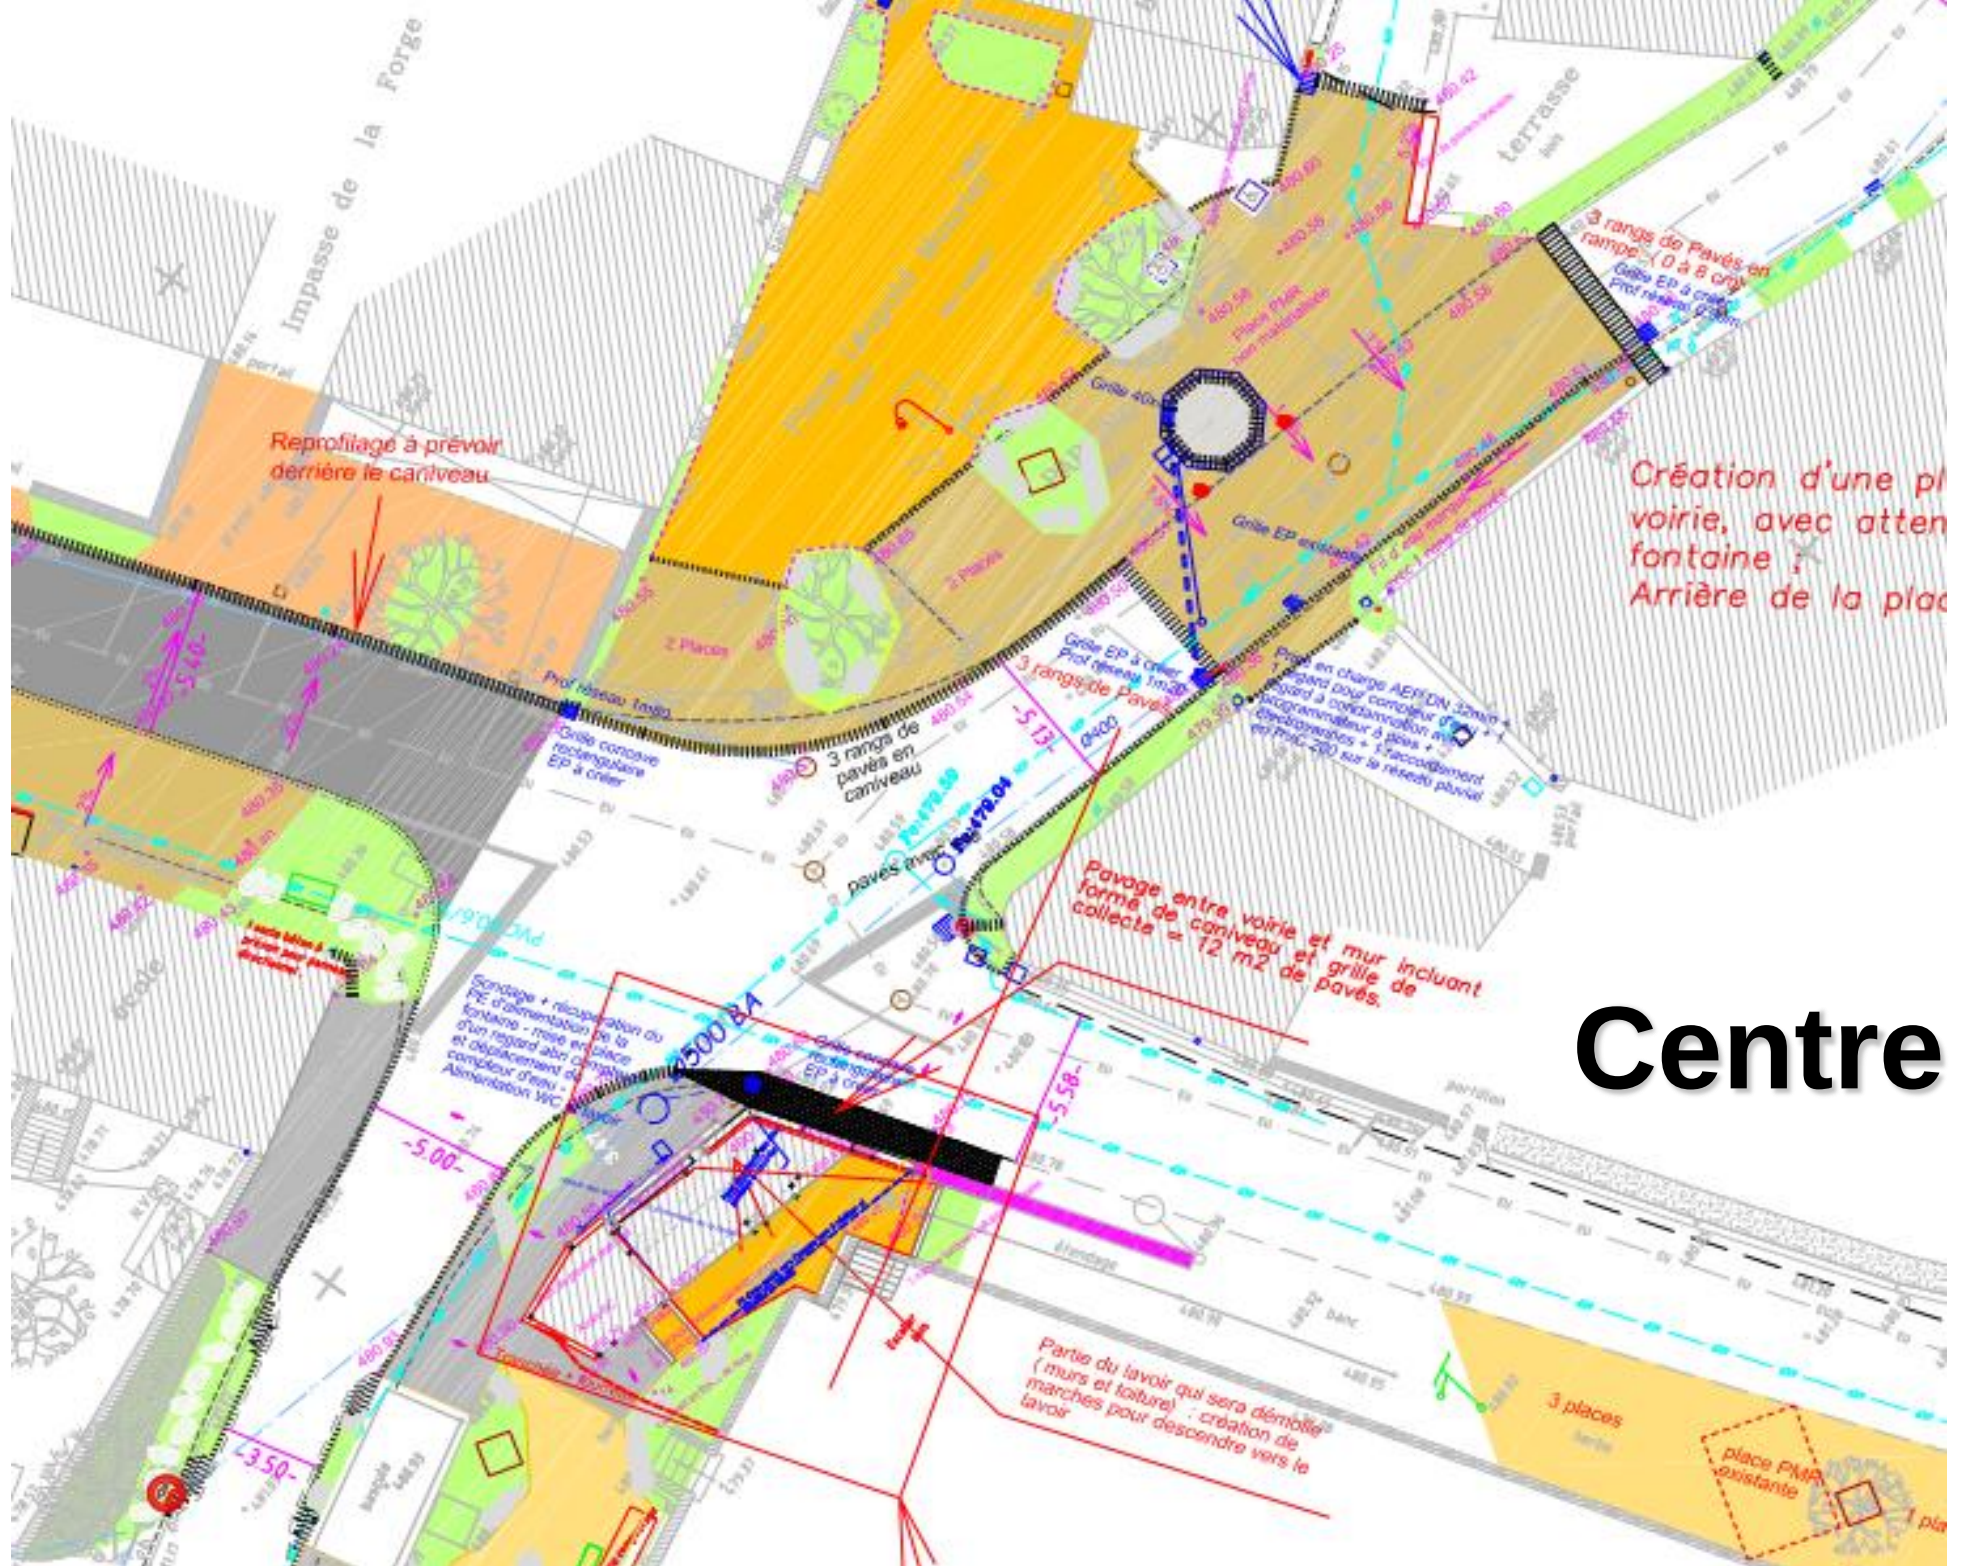

Centre

Calendrier

[illegible]

Septembre

	s35	s36	s37	s38	s39
Préparations diverses					
Sciages et décapages écluses et lavoir					
Terrassements pour structure lavoir place Mourier et en face mairie					
Préparation descente salle des fêtes					
Maçon : escalier du tennis + lavoir + muret rte de Teyssières					
Chargement et transport de blocs 2 écluses et SDF Terrassement des fondations pour murs pierres sèches					
RESEAU EAUX PLUVIALES et EAU POTABLE					
Découpes et décapages des frontages Rte de Vesc					
Murailleur = écluse route de Vesc Écluse rte de Teyssières en chantier participatif Descente salle des fêtes (début)		Mise en place des blocs	Vesc	Teyssières puis SDF	
Lot paysage : remblai écluse Rte de Vesc + terre végétale -Talus Rte de Vesc -Frontages rte de Vesc (décompactage / TV) -descente salle des fêtes (Décompactage / Remblais /TV)					
Semis écluse rte de Teyssières et salle des fêtes					
Découpes, décapages, profilages (PLACE MOURIER + Centre village, mairie, école, ...)					Possibilité de commencer en S39 pour avoir de la marge

Octobre

	s40	s41	s42	s43 Vacances scolaires RD barrée	s44 Vacances scolaires Pont de Toussaint
	Murailleur = muret de l'écluse route de Vesc Puis écluse rte de Teyssières en chantier participatif / puis Descente salle des fêtes / Puis chantiers participatifs en option			chantiers participatifs	
	Lot paysage : remblai écluse Rte de Vesc + terre végétale -Talus Rte de Vesc -Frontages rte de Vesc : décompactage / TV -descente salle des fêtes : Décompactage / Remblais /TV				
	Semis (après finalisation écluse rte de Teyssières et salle des fêtes)				
	Découpes, décapages, profilages (PLACE MOURIER + Centre village, mairie, école, ...)				
	Fondations pavés place Mourier, devant école, puis sur les traversées de RD en début de S 43 (Rte de Vesc et devant la mairie)				
	Pose des pavés (totalité du chantier, avec les traversées de RD en S 43 + pavés frontages)		8 à 10 jours		séchage 3 semaines
	Pose des cavaliers, mises à la cote, + apport de grave pour bord des écluses + peintures et panneaux pour écluses, socles béton pour fontaine, panneaux directionnels,				

Novembre et Décembre

	s45		s46	s47	s48
	Reprofilage place du tennis et autres finitions n'impactant pas les pavés (suite)				
	Préparation des sols et revêtements des espaces : enrobés, bicouche, stabilisé, Sciage enrobés et bicouche				
	Amenée des blocs, finitions diverses (0/20, clous, panneaux, marquages, ...)			Alternat et/ou déviation en dehors des horaires de passage du bus scolaire	
		s49	s50	s51	s52 Vacances NOEL
	Amenée des blocs, finitions diverses (0/20, clous, panneaux, marquages, ...)				
	Mise en place des blocs préparation des sols pour ilots en voirie (place Mourier prioritaire)				
	Mise en place BRF / Plantations à suivre ou plus tard si conditions météo défavorables				
